Műszaki Ütemterv

4.2.2. Melléklet

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
1	**KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 ÉKDU 2**	**809 nap**	**Sze 17.08.30.**	**H 20.10.26.**
2	**Előkészítés**	**38 nap**	**Sze 17.08.30.**	**K 17.10.24.**
3	Szerződés aláírása	0 nap	Sze 17.08.30.	Sze 17.08.30.
4	Szerződés hatályba lépése	0 nap	H 17.10.16.	H 17.10.16.
5	Munkaterület átadása tervezésre	0 nap	K 17.10.24.	K 17.10.24.
6	**Vízjogi létesítési engedély**	**235 nap**	**K 17.10.24.**	**P 18.09.28.**
7	Engedélyezési tervek elkészítése (Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros)	2 nap	K 17.10.24.	Sze 17.10.25.
8	Engedélyezési tervek elkészítése (Pusztaszabolcs hálózat)	145 nap	H 18.03.05.	P 18.09.28.
9	Engedélyezési tervek elkészítése (Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep)	145 nap	K 18.01.30.	H 18.08.27.
10	Engedélyezési tervek elkészítése (Neszmély-Almásfüzitő-Dunaalmás hálózat)	47 nap	K 18.01.23.	Cs 18.03.29.
11	Engedélyezési tervek elkészítése (Dunaalmás szennyvíztisztító telep)	104 nap	K 18.01.30.	P 18.06.29.
12	**Kiviteli tervek készítése**	**172 nap**	**H 18.01.22.**	**K 18.09.25.**
13	Kiviteli tervek elkészítése (Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros)	150 nap	H 18.01.22.	P 18.08.24.
14	Kiviteli tervek elkészítése (Pusztaszabolcs hálózat)	150 nap	H 18.01.22.	P 18.08.24.
15	Kiviteli tervek elkészítése (Pusztaszabolcs szennyvíztisztító telep)	21 nap	K 18.08.28.	K 18.09.25.
16	Kiviteli tervek elkészítése (Neszmély-Almásfüzitő-Dunaalmás hálózat)	100 nap	K 18.04.03.	Sze 18.08.22.
17	Kiviteli tervek elkészítése (Dunaalmás szennyvíztisztító telep)	21 nap	H 18.07.02.	H 18.07.30.
18	Munkaterület átadás Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros I. ütem	0 nap	P 18.02.23.	P 18.02.23.
19	Munkakezdési engedély (K-R-D I. Ütem) kiadása építési/bontási munkákra	0 nap	Cs 18.05.03.	Cs 18.05.03.
20	Munkaterület átadás Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros II. ütem	0 nap	H 18.06.25.	H 18.06.25.
21	Munkaterület átadás Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros III. ütem	0 nap	P 18.09.07.	P 18.09.07.
22	Munkakezdési engedély (K-R-D III. ütem) kiadása építési/bontási munkákra	0 nap	P 18.09.21.	P 18.09.21.
23	Munkaterület átadás szennyvíztisztító telep	0 nap	P 18.08.03.	P 18.08.03.
24	Munkakezdési engedély (szv.tisztító telep) kiadása építési/bontási munkákra	0 nap	H 18.08.20.	H 18.08.20.
25	**Kivitelezési munka**	**702 nap**	**P 18.02.02.**	**H 20.10.26.**
26	**Kulcs Község szennyvízcsatornahálózat építése**	**625 nap**	**P 18.02.02.**	**Cs 20.07.09.**
27	**Á1 Öblözet**	**128 nap**	**H 18.07.16.**	**Sze 19.01.16.**
28	SZ-1-0-0-0 (Kossuth, Muskátli, Mandula u.)	60 nap	H 18.07.16.	P 18.10.05.
29	SZ-1-1-0-0 (Mandula u.)	4 nap	H 18.07.16.	Cs 18.07.19.
30	SZ-1-2-0-0 (Muskátli, Hajnal u.)	5 nap	P 18.07.20.	Cs 18.07.26.
31	SZ-1-3-0-0 (Kossuth, Gyöngysor, Hajnal u.)	15 nap	P 18.07.27.	Cs 18.08.16.
32	SZ-1-4-0-0 (Kossuth u., Sőtér sétány, Aranyhegy)	27 nap	P 18.08.17.	H 18.09.24.
33	SZ-1-4-1-0 (Sőtér sétány, Hajnal u.)	5 nap	K 18.09.25.	H 18.10.01.

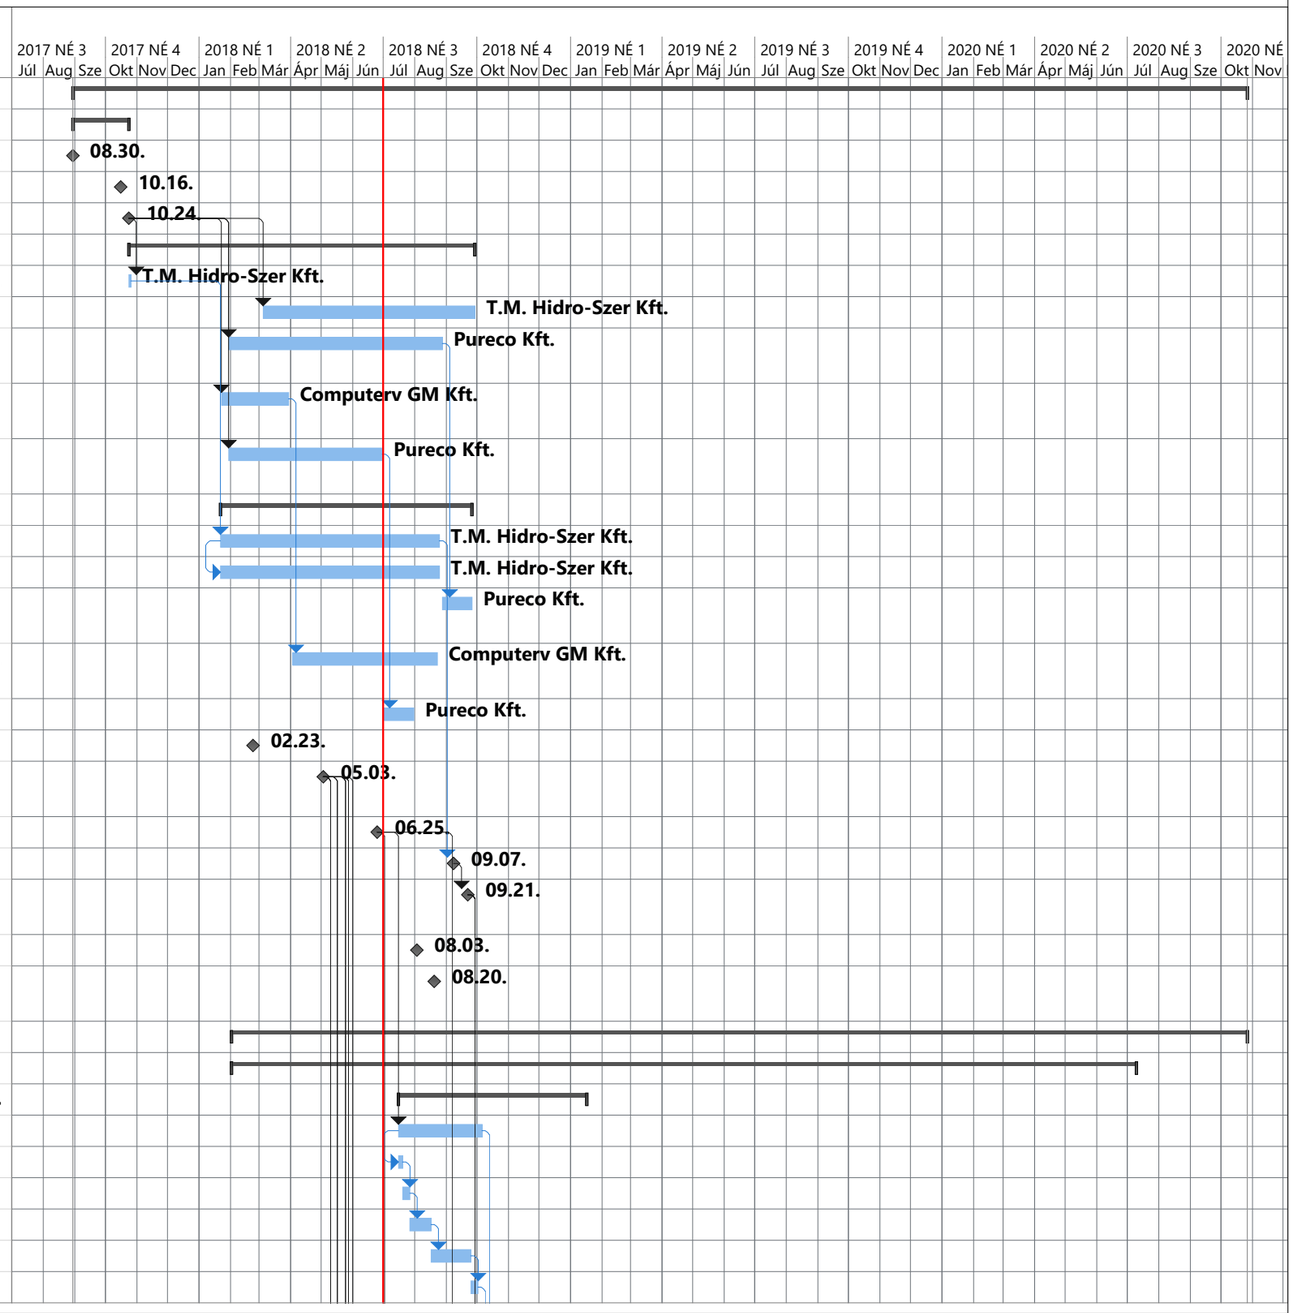

Felcsút, 2018. 06. 30.

Tevékenység		Projekt összefoglalása		Kézi tevékenység		Csak kezdet		Határidő	
Megszakított tevékenység		Inaktív tevékenység		Csak időtartam		Csak befejezés		Végrehajtás	
Mérföldkő		Inaktív mérföldkő		Kézi összefoglaló vetítés		Külső tevékenységek		Kézi állapot	
Összefoglalás		Inaktív összefoglalás		Kézi összegzés		Külső mérföldkő			

A Műszaki Ellenőr az Ütemtervben lévő adatokat áttekintette és javasolja a Mérnöknek jóváhagyásra.

.....
Műszaki Ellenőr

.....
FIDIC Mérnök

Műszaki Ütemterv

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
34	SZ-1-4-2-0 (Sőtér sétány, Ifjúság u.)	17 nap	H 18.10.08.	Sze 18.10.31.
35	SZ-1-5-0-0 (Kossuth, Bem u.)	14 nap	K 18.10.02.	P 18.10.19.
36	SZ-1-5-1-0 (Bem, Temető u.)	7 nap	H 18.10.22.	Sze 18.10.31.
37	SZ-1-5-2-0 (Bem, Ifjúság u.)	11 nap	P 18.11.02.	P 18.11.16.
38	SZ-1-6-0-0 (Kossuth u.)	15 nap	P 18.11.02.	Cs 18.11.22.
39	SZ-1-6-1-0 (Kossuth, Rákóczi u.)	40 nap	H 18.11.19.	Sze 19.01.16.
40	SZ-1-6-1-1 (Rákóczi, Óvoda u.)	33 nap	P 18.11.23.	P 19.01.11.
41	**Á2 Öblözet**	**55 nap**	**Cs 18.05.03.**	**Cs 18.07.19.**
42	SZ-2-0-0-0 (Sportelep, Rákóczi, Nyár, Petőfi, Arany J. u.)	55 nap	Cs 18.05.03.	Cs 18.07.19.
43	SZ-2-1-0-0 (Arany J. u.)	5 nap	Cs 18.05.17.	Cs 18.05.24.
44	SZ-2-2-0-0 (Nyár, Ősz u.)	25 nap	P 18.05.25.	Cs 18.06.28.
45	SZ-2-2-1-0 (Nyár, Pesti u.)	13 nap	P 18.05.25.	K 18.06.12.
46	SZ-2-3-0-0 (Rákóczi u.)	25 nap	Cs 18.05.17.	Cs 18.06.21.
47	SZ-2-3-1-0 (Rózsahegyi u.)	2 nap	H 18.05.28.	K 18.05.29.
48	SZ-2-3-2 (Névtelen u.)	5 nap	H 18.05.28.	P 18.06.01.
49	SZ-2-3-3-0 (Tamási Á u.)	22 nap	Cs 18.05.03.	H 18.06.04.
50	SZ-2-4-0-0 (Tamási Á., Rákóczi, Tavasz u.)	12 nap	P 18.06.01.	H 18.06.18.
51	SZNY-2-0 (Nyár, Petőfi, Arany J. u.)	55 nap	Cs 18.05.03.	Cs 18.07.19.
52	**Á3 Öblözet**	**86 nap**	**P 18.09.07.**	**P 19.01.11.**
53	SZ-3-0-0-0 (Arany J. u.)	80 nap	P 18.09.07.	Cs 19.01.03.
54	SZNY-3-0 (Arany J. u.)	86 nap	P 18.09.07.	P 19.01.11.
55	**Á4 Öblözet**	**50 nap**	**H 18.07.02.**	**P 18.09.07.**
56	SZ-4-0-0-0 (Arany J., Kulcsod u.)	50 nap	H 18.07.02.	P 18.09.07.
57	SZ-4-1-0-0 (Kulcsod, Molnár J. u.)	8 nap	H 18.07.02.	Sze 18.07.11.
58	SZ-4-2-0-0 (Arany J., Fecske u.)	18 nap	Sze 18.07.18.	P 18.08.10.
59	SZ-4-2-1-0 (Fecske, Kecset u.)	4 nap	Cs 18.07.12.	K 18.07.17.
60	SZ-4-3-0-0 (Arany J. u.)	5 nap	Sze 18.07.18.	K 18.07.24.
61	SZ-4-4-0-0 (Arany J., Rozmaring u.)	6 nap	Sze 18.07.25.	Sze 18.08.01.
62	SZ-4-4-1-0 (Rozmaring, Rózsahegyi u.)	40 nap	H 18.07.02.	P 18.08.24.
63	SZNY-4-0 (Rozmaring u.)	4 nap	Sze 18.07.25.	H 18.07.30.
64	**Á5 Öblözet**	**6 nap**	**H 18.08.27.**	**H 18.09.03.**
65	SZ-5-0-0 (Bartók B. u.)	6 nap	H 18.08.27.	H 18.09.03.
66	SZNY-5-0 (Bartók B. u.)	6 nap	H 18.08.27.	H 18.09.03.
67	**Á6 Öblözet**	**34 nap**	**H 18.09.24.**	**H 18.11.12.**
68	SZ-6-0-0-0 (Hegyalja u.)	25 nap	H 18.09.24.	H 18.10.29.
69	SZ-6-1-0-0 (Hegyalja, Naphegy u.)	8 nap	H 18.09.24.	Sze 18.10.03.
70	SZ-6-2-0-0 (Hegyalja, Szivárvány u.)	7 nap	Cs 18.10.04.	P 18.10.12.
71	SZ-6-3-0-0 (Hegyalja u., Hegyalja köz)	6 nap	Cs 18.10.04.	Cs 18.10.11.
72	SZ-6-4-0-0 (Hegyalja, Meredek u.)	7 nap	H 18.10.15.	Sze 18.10.24.

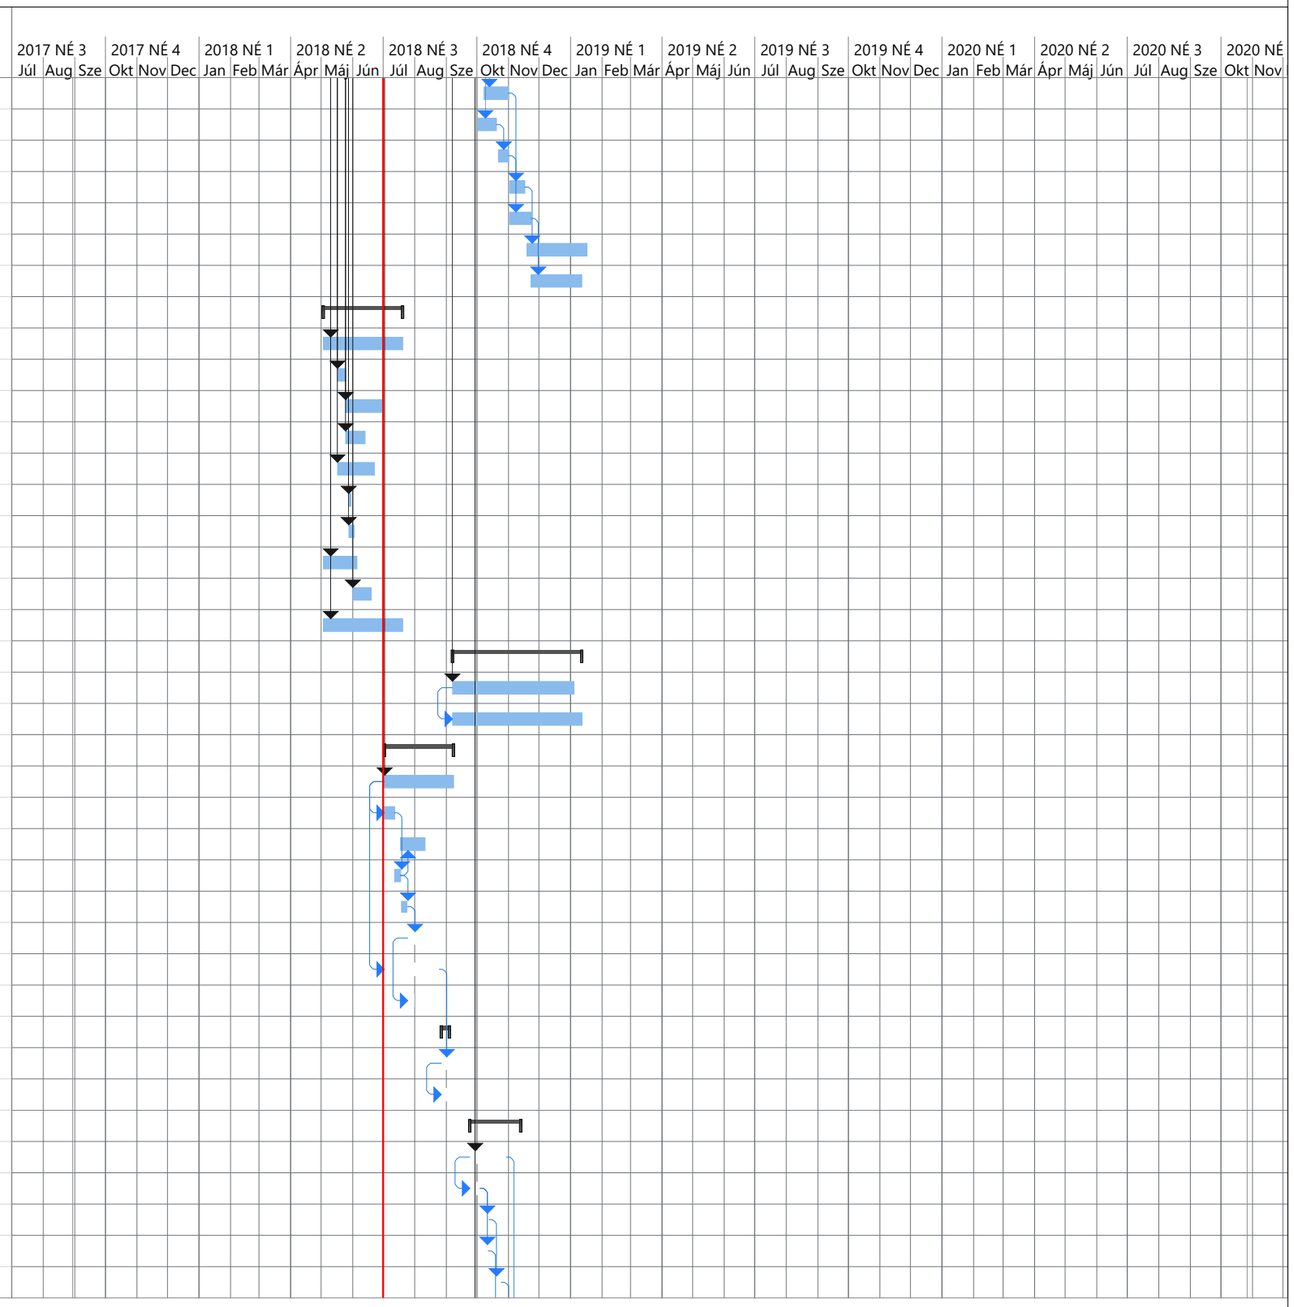

Felcsút, 2018. 06. 30.

Tevékenység		Projekt összefoglalása		Kézi tevékenység		Csak kezdet		Határidő	
Megszakított tevékenység		Inaktív tevékenység		Csak időtartam		Csak befejezés		Végrehajtás	
Mérföldkő		Inaktív mérföldkő		Kézi összefoglaló vetítés		Külső tevékenységek		Kézi állapot	
Összefoglalás		Inaktív összefoglalás		Kézi összegzés		Külső mérföldkő			

A Műszaki Ellenőr az Ütemtervben lévő adatokat áttekintette és javasolja a Mérnöknek jóváhagyásra.

.....
Műszaki Ellenőr

.....
FIDIC Mérnök

Műszaki Ütemterv

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
73	SZ-6-5-0-0 (Hegyalja u., Keskeny köz)	5 nap	P 18.10.12.	Cs 18.10.18.
74	SZ-6-6-0-0 (Hegyalja u., Aranyhegy)	12 nap	Cs 18.10.25.	H 18.11.12.
75	SZ-6-7-0-0 (Hegyalja u.)	4 nap	K 18.10.30.	H 18.11.05.
76	SZNY-6-0 (Hegyalja u.)	5 nap	K 18.11.06.	H 18.11.12.
77	**Á7 Öblözet**	**68 nap**	**H 18.09.24.**	**Sze 19.01.02.**
78	SZ-7-0-0 (Temető u.)	34 nap	H 18.09.24.	H 18.11.12.
79	SZNY-7-0 (Temető u.)	34 nap	K 18.11.13.	Sze 19.01.02.
80	**Á8 Öblözet**	**74 nap**	**H 18.09.24.**	**Cs 19.01.10.**
81	SZ-8-0-0-0 (Dózsa Gy., Deák F. u.)	38 nap	H 18.09.24.	P 18.11.16.
82	SZ-8-1-0-0 (Deák F., Bem J. u.)	16 nap	H 18.09.24.	H 18.10.15.
83	SZ-8-2-0-0 (Dózsa Gy. u.)	44 nap	H 18.09.24.	H 18.11.26.
84	SZ-8-2-1-0 (Dózsa Gy. U.)	15 nap	K 18.10.16.	Sze 18.11.07.
85	SZ-8-2-2-0 (Dózsa Gy., Árpád, Kossuth u.)	29 nap	Cs 18.11.08.	K 18.12.18.
86	SZ-8-2-3-0 (Dózsa Gy., Kertbarátok u.)	6 nap	H 18.11.19.	H 18.11.26.
87	SZNY-8-0 (Bem J. u.)	30 nap	K 18.11.27.	Cs 19.01.10.
88	**Á9 Öblözet**	**30 nap**	**H 18.09.24.**	**K 18.11.06.**
89	SZ-9-0-0-0 (Deák F. u.)	24 nap	H 18.09.24.	P 18.10.26.
90	SZ-9-1-0-0 (Deák F., Névtelen u.)	3 nap	H 18.09.24.	Sze 18.09.26.
91	SZ-9-2-0-0 (Deák F., Névtelen u.)	3 nap	Cs 18.09.27.	H 18.10.01.
92	SZ-9-3-0-0 (Deák F., Sőtér sétány)	24 nap	K 18.10.02.	K 18.11.06.
93	SZNY-9-0 (Deák F. u.)	20 nap	K 18.10.02.	K 18.10.30.
94	**Szennyvízátemelők építése**	**341 nap**	**P 18.02.02.**	**P 19.06.07.**
95	**ÁK jelű szennyvízátemelő (Kulcs)**	**40 nap**	**H 18.09.24.**	**K 18.11.20.**
96	Építészet	10 nap	H 18.09.24.	P 18.10.05.
97	Gépészet	10 nap	H 18.10.08.	P 18.10.19.
98	Erősáram	10 nap	H 18.10.22.	K 18.11.06.
99	Irányítástechnika	10 nap	Sze 18.11.07.	K 18.11.20.
100	**Á2 jelű szennyvízátemelő (Sport telep, 0423/2 hrsz.)**	**40 nap**	**P 18.02.02.**	**K 18.04.03.**
101	Építészet	10 nap	P 18.02.02.	Cs 18.02.15.
102	Gépészet	10 nap	P 18.02.16.	Cs 18.03.01.
103	Erősáram	10 nap	P 18.03.02.	P 18.03.16.
104	Irányítástechnika	10 nap	H 18.03.19.	K 18.04.03.
105	**Á3 jelű szennyvízátemelő (Arany J. u. 2072 hrsz.)**	**40 nap**	**Sze 18.12.12.**	**P 19.02.08.**
106	Építészet	10 nap	Sze 18.12.12.	Cs 18.12.27.
107	Gépészet	10 nap	P 18.12.28.	P 19.01.11.
108	Erősáram	10 nap	H 19.01.14.	P 19.01.25.
109	Irányítástechnika	10 nap	H 19.01.28.	P 19.02.08.
110	**Á4 jelű szennyvízátemelő (Arany J. u., 3779 hrsz.)**	**40 nap**	**Sze 18.04.04.**	**Cs 18.05.31.**
111	Építészet	10 nap	Sze 18.04.04.	K 18.04.17.

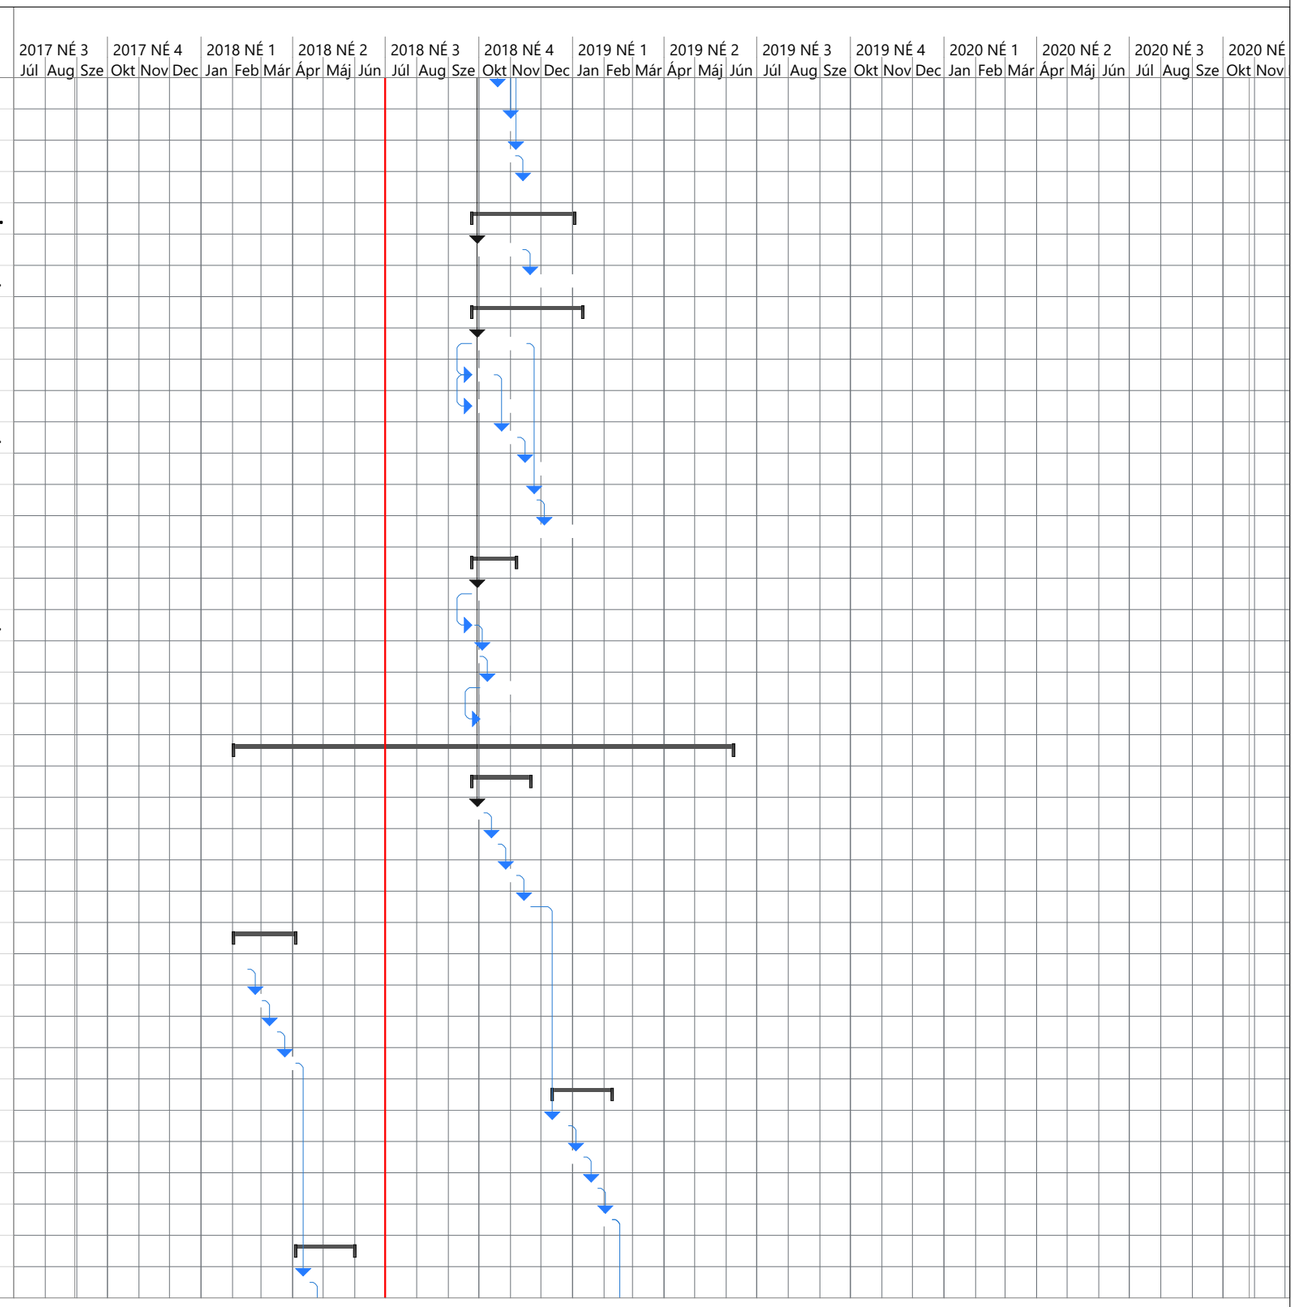

Felcsút, 2018. 06. 30.

Tevékenység		Projekt összefoglalása		Kézi tevékenység		Csak kezdet	Határidő
Megszakított tevékenység		Inaktív tevékenység		Csak időtartam		Csak befejezés	Végrehajtás
Mérföldkő		Inaktív mérföldkő		Kézi összefoglaló vetítés		Külső tevékenységek	Kézi állapot
Összefoglalás		Inaktív összefoglalás		Kézi összegzés		Külső mérföldkő	

A Műszaki Ellenőr az Ütemtervben lévő adatokat áttekintette és javasolja a Mérnöknek jóváhagyásra.

.....
Műszaki Ellenőr

.....
FIDIC Mérnök

Műszaki Ütemterv

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és –kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2.)

Azonos	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
112	Gépészet	10 nap	Sze 18.04.18.	Sze 18.05.02.
113	Erősáram	10 nap	Cs 18.05.03.	Sze 18.05.16.
114	Irányítástechnika	10 nap	Cs 18.05.17.	Cs 18.05.31.
115	**Á5 jelű szennyvízátemelő (Bartók B. u., 3451 hrsz.)**	**40 nap**	**P 18.06.01.**	**Cs 18.07.26.**
116	Építészet	10 nap	P 18.06.01.	Cs 18.06.14.
117	Gépészet	10 nap	P 18.06.15.	Cs 18.06.28.
118	Erősáram	10 nap	P 18.06.29.	Cs 18.07.12.
119	Irányítástechnika	10 nap	P 18.07.13.	Cs 18.07.26.
120	**Á6 jelű szennyvízátemelő (Hegyalja u., 3249 hrsz.)**	**45 nap**	**H 19.02.11.**	**P 19.04.12.**
121	Építészet	10 nap	H 19.02.11.	P 19.02.22.
122	Gépészet	10 nap	H 19.03.04.	P 19.03.15.
123	Erősáram	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.
124	Irányítástechnika	10 nap	H 19.04.01.	P 19.04.12.
125	**Á7 jelű szennyvízátemelő (Temető u., 3413 hrsz.)**	**45 nap**	**H 19.02.11.**	**P 19.04.12.**
126	Építészet	10 nap	H 19.02.11.	P 19.02.22.
127	Gépészet	10 nap	H 19.03.04.	P 19.03.15.
128	Erősáram	10 nap	H 19.03.18.	P 19.03.29.
129	Irányítástechnika	10 nap	H 19.04.01.	P 19.04.12.
130	**Á8 jelű szennyvízátemelő (Dózsa Gy. U., 2360 hrsz.)**	**30 nap**	**H 19.04.15.**	**P 19.05.24.**
131	Építészet	10 nap	H 19.04.15.	P 19.04.26.
132	Gépészet	10 nap	H 19.04.29.	P 19.05.10.
133	Erősáram	10 nap	H 19.04.29.	P 19.05.10.
134	Irányítástechnika	10 nap	H 19.05.13.	P 19.05.24.
135	**Á9 jelű szennyvízátemelő (Deák F. u., 3104 hrsz.)**	**40 nap**	**H 19.04.15.**	**P 19.06.07.**
136	Építészet	10 nap	H 19.04.15.	P 19.04.26.
137	Gépészet	10 nap	H 19.04.29.	P 19.05.10.
138	Erősáram	10 nap	H 19.05.13.	P 19.05.24.
139	Irányítástechnika	10 nap	H 19.05.27.	P 19.06.07.
140	**Kiegészítő munkák**	**510 nap**	**P 18.07.20.**	**Cs 20.07.09.**
145	**Dunaújváros szennyvízcsatornahálózat építése**	**541 nap**	**H 18.09.24.**	**H 20.10.26.**
223	**Pusztaszabolcs hálózat és rekonstrukció**	**160 nap**	**Sze 18.08.01.**	**K 19.03.19.**
226	**Pusztaszabolcs Község szennyvíztisztító telep felújítása**	**300 nap**	**P 18.08.03.**	**Cs 19.10.03.**
229	**Neszmély Község szennyvízcsatornahálózat építése**	**60 nap**	**H 18.09.03.**	**K 18.11.27.**
231	**Almásfüzitő szennyvízcsatornahálózat építése**	**300 nap**	**Sze 18.11.28.**	**P 20.01.24.**
233	**Dunaalmás Község szennyvízcsatornahálózat építése**	**60 nap**	**H 20.01.27.**	**P 20.04.17.**
235	**Dunaalmás Község szennyvíztisztító telep építése**	**321 nap**	**P 18.08.03.**	**P 19.11.01.**
238	**Műszaki átadás**	**594 nap**	**H 18.07.02.**	**Cs 20.10.15.**

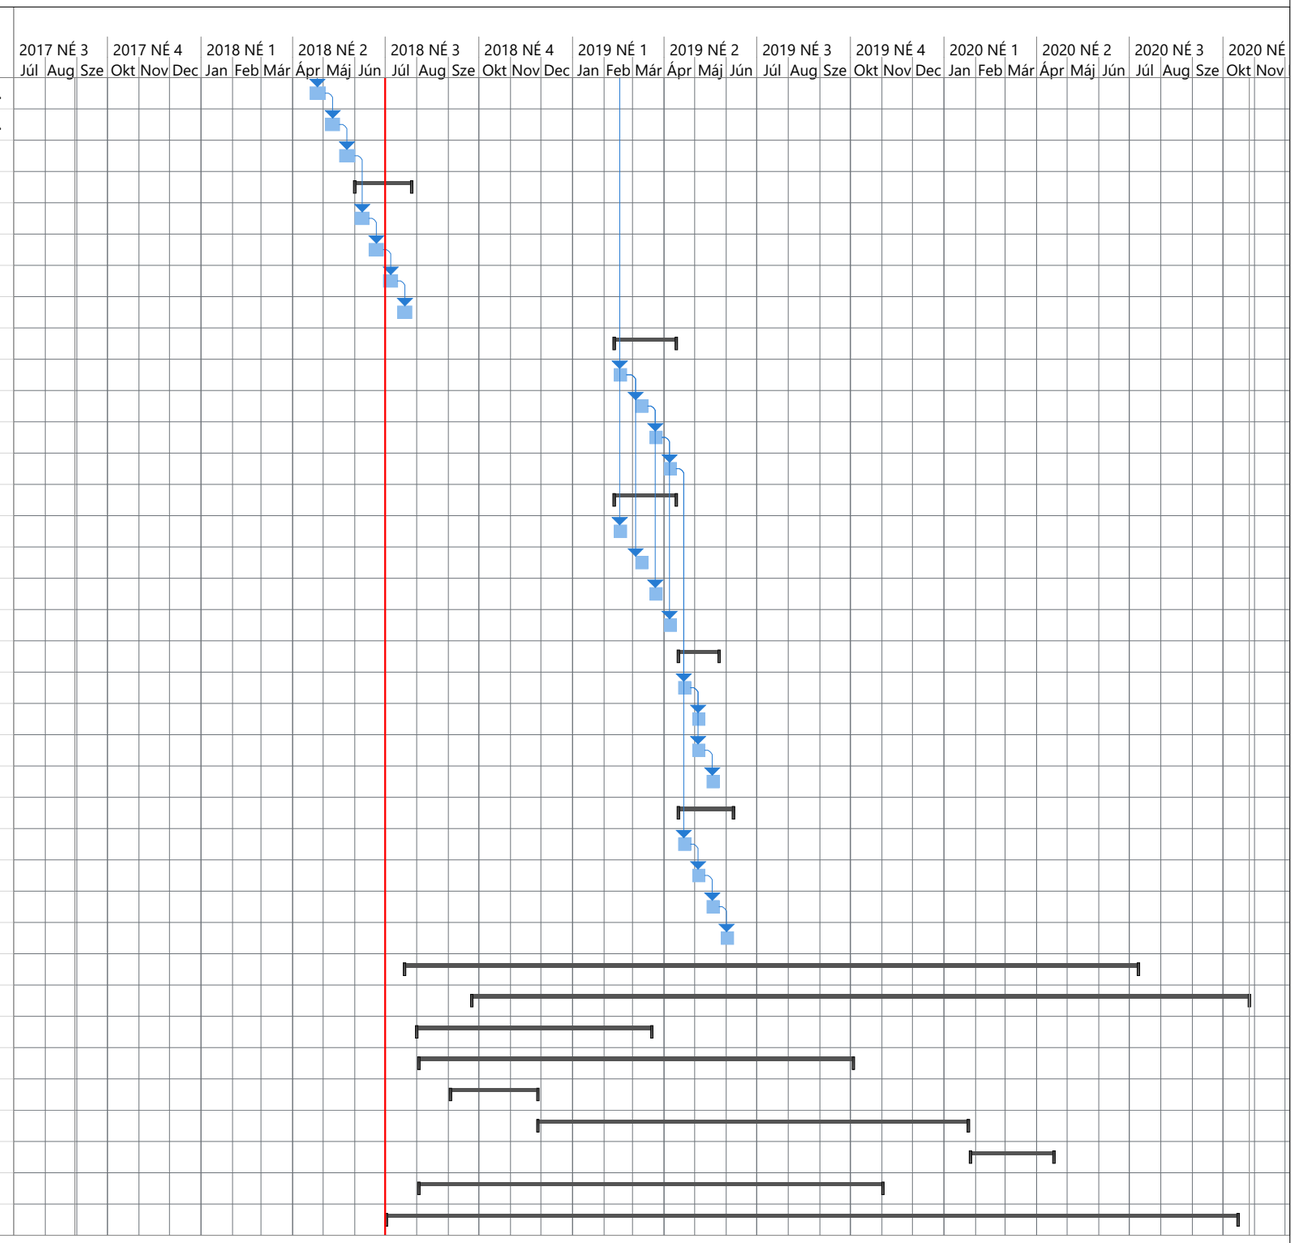

Felcsút, 2018. 06. 30.

Tevékenység		Projekt összefoglalása		Kézi tevékenység		Csak kezdet		Határidő	
Megszakított tevékenység		Inaktív tevékenység		Csak időtartam		Csak befejezés		Végrehajtás	
Mérföldkő		Inaktív mérföldkő		Kézi összefoglaló vetítés		Külső tevékenységek		Kézi állapot	
Összefoglalás		Inaktív összefoglalás		Kézi összegzés		Külső mérföldkő			

A Műszaki Ellenőr az Ütemtervben lévő adatokat áttekintette és javasolja a Mérnöknek jóváhagyásra.

.....
Műszaki Ellenőr

.....
FIDIC Mérnök
